



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú




REPORTE JULIO 2019

WWW.PROINVERSION.GOB.PE

A. ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO COMPARACIÓN ENERO - JULIO


Enero 2019

PROYECTOS 2019 - 2021
58 PROYECTOS - USD 10,327 M

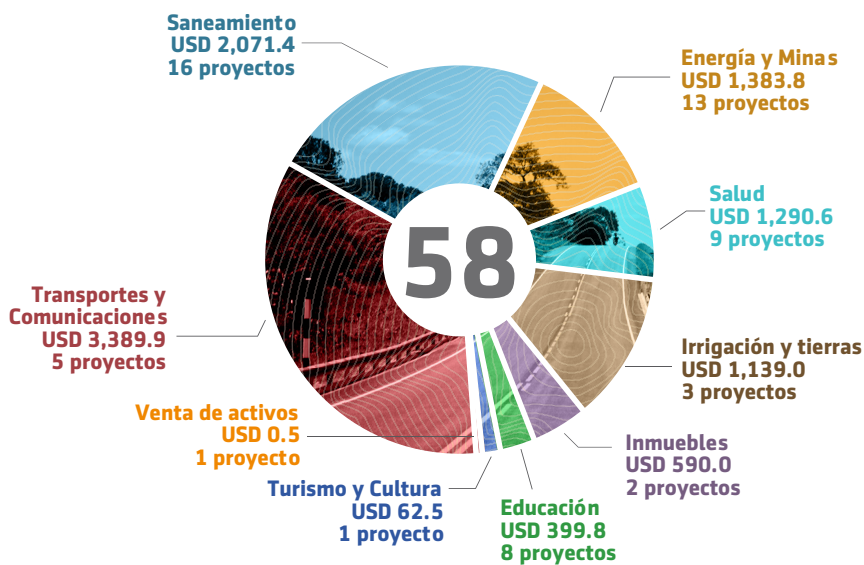

Julio 2019

PROYECTOS 2019 - 2022
51 PROYECTOS - USD 9,211 M

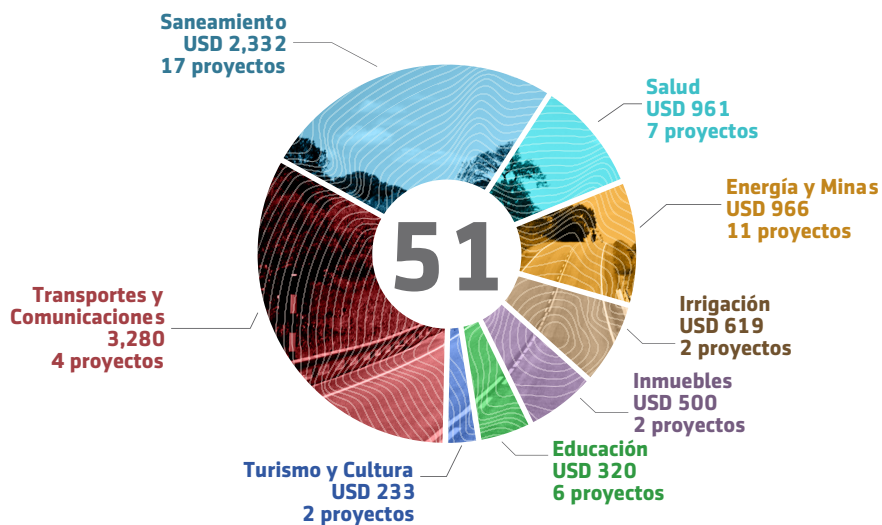

PROYECTOS A SER ADJUDICADOS EN 2019

Comparación

INFORMACIÓN PUBLICADA EN ENERO 2019		
TRANSPORTES MONTO USD 877 M	Ferrocarril Huancayo - Huancavelica	Terminal Portuario de Chimbote Terminal Portuario de Marcona
ENERGÍA Y MINAS MONTO USD 1,326 M	Masificación de gas natural ENOSA Repotenciación y Compensador reactivo variable en S.E Trujillo Subestación Nueva Carhuaquero Compensador reactivo variable en S.E San Juan L.T. Piura - Nueva Frontera	Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía Enlace 500 kV La Niña - Piura Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes Proyecto minero Algarrobo
AGUA Y SANEAMIENTO MONTO USD 263 M	PTAR Titicaca	
OTROS SECTORES MONTO: Por definir	Centro de Convenciones de Lima	Tierras no agrícolas de Chavimochic
Total: USD 2,466 millones		

PROYECTO EN FASE DE FORMULACIÓN
 PROYECTO EN FASE DE ESTRUCTURACIÓN
 PROYECTO EN FASE DE TRANSACCIÓN

INFORMACIÓN A JULIO 2019	
TRANSPORTES MONTO USD 227 M	Ferrocarril Huancayo - Huancavelica
ENERGÍA Y MINAS MONTO USD 344 M	Masificación de gas natural Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía Enlace 500 kV La Niña - Piura Enlace 220 kV Pariñas-Nva. Tumbes
AGUA Y SANEAMIENTO MONTO USD 270 M	PTAR Titicaca (Adjudicado 29.04.2019)
OTROS SECTORES MONTO: Por definir	Tierras no agrícolas de Chavimochic
Total: USD 841 millones	

VARIACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS

El actual portafolio **2019-2022** de PROINVERSIÓN está constituido por 51 proyectos, 7 proyectos por debajo de la información publicada en enero 2019. En enero 2019 se daba cuenta de 58 proyectos de los cuales, 6 fueron retirados del portafolio, 3 se encuentran suspendidos y 1 de ellos no tiene en éste momento una fecha estimada de Buena Pro. Además, se están considerando 3 proyectos adicionales para el período 2019-2022.



1. Terminal Portuario Chimbote (IPC) Proyecto retirado del portafolio

Proponente se desistió de la Iniciativa Privada Autosostenible (IPA). PROINVERSIÓN quedó a disposición del sector para seguir promoviendo un terminal portuario en Chimbote, ya sea por iniciativa estatal o iniciativa privada, en el nuevo contexto del convenio suscrito este año entre la APN y el Gobierno Regional de Ancash, que integra el terminal regional con el área destinada al terminal de contenedores.



2. Repotenciación de la Línea de Transmisión Carabayllo - Chimbote - Trujillo 500 kV y Compensador Reactivo Variable +400/-150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV (IEA)

Proyecto suspendido

Pese a los esfuerzos realizados en la difusión y promoción del proyecto, el 15 de febrero de 2019 culminó el plazo de presentación de las solicitudes de calificación (previsto en el cronograma del Concurso) recibándose únicamente la solicitud de una empresa.

Proyecto en revisión por el Sector. A la espera que el MINEM defina el tratamiento del proyecto.



3 y 4. Compensador Reactivo Variable (SCV o Similar) +200/-100 MVAR en la SE San Juan 220 kV / Subestación Nueva Carhuaquero 220 kV (IEA)

Proyecto suspendido

Proyecto en revisión por el Sector. A la espera que el MINEM defina el tratamiento del proyecto.



5. Instalación de Servicios de Salud Especializados en el Distrito de Piura y Redimensionamiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo III – Sullana (IPC)

Proyecto retirado del portafolio

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 19-2019-DPP/MINSA.01 de fecha 27 de mayo de 2019, PROINVERSIÓN procedió a rechazar la IPC “Instalación de Servicios de salud especializado en el distrito de Piura y Redimensionamiento de los servicios de Salud del Hospital de Apoyo III Sullana”, en atención a la decisión del Gobierno Regional de Piura contenido en el Oficio N° 166-2019/GRP-400000 y el Acuerdo Regional N° 1566-2019/GRP-CR, lo cual fue comunicado al Proponente el 29.05.19.



6. Creación del Instituto del Niño y Adolescente del Seguro Social Essalud (IEC)

Proyecto retirado del portafolio

Mediante Oficio N° 397-GG-ESSALUD-2018 del 28.11.18, ESSALUD comunicó a PROINVERSIÓN la no continuidad del Proyecto.



7. Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica (IPC)

Proyecto retirado del portafolio

Mediante la carta N° 043-2019-CONSORCIO de fecha 07.05.2019, el Proponente comunicó su desistimiento de continuar con el trámite de la IPC.



8. Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios Complementarios de Centros Educativos Región Ayacucho (IPC)

Proyecto retirado del portafolio

Por desistimiento del Proponente, mediante Resolución del Director de Proyecto N° 01-2019/DEP.43 del 03.04.2019, se resuelve concluir el procedimiento de evaluación de la IPC.



9. Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios Complementarios de Centros Educativos Región San Martín Zona 2 (IPC)

Proyecto retirado del portafolio

Por desistimiento del Proponente, mediante Resolución del Director de Proyecto N° 01-2019/DEP.44 del 03.04.2019, se resuelve concluir el procedimiento de evaluación de la IPC, por desistimiento del Proponente.



10. Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. (IEPA)

Proyecto sin fecha estimada de Buena Pro

En el mes de julio se espera recibir el informe de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), respecto a la estrategia de venta.

Proyectos que se suman al portafolio 2019-2022

1. Saneamiento para Lima Norte - Nueva PTAR Norte
2. Subestación Valle del Chira 220/60/23 kV de 100 MVA
3. Proyecto Turístico Teleférico Centro Histórico de Lima - Cerro San Cristóbal

• • •

VARIACIÓN DE LAS FECHAS ESTIMADAS DE BUENA PRO

Cambio de año (del 2019 al 2020)



1. Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (IPA)

El proponente solicitó plazo hasta fines de este año para que pueda completar la evaluación de la futura demanda que sustente la inversión en el proyecto.



2. Modernización de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Noroeste S.A. - ENOSA (IPPA)

La modificación se explica porque es necesario culminar la valorización de la empresa ENOSA como resultado de la identificación de contingencias legales y administrativas que no estaban registradas en los estados financieros de la empresa.



3. Gestión Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción, Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras Integrantes del Yacimiento TG-3 del El Algarrobo (IPPA)

Luego de la evaluación realizada por los asesores técnicos, legales, sociales y financieros contratados por PROINVERSIÓN, se identificaron observaciones a la IPPA que resultarán en modificaciones y/o ampliaciones a la misma, y que requerirán ser coordinadas con el Sector y subsecuentemente con el Proponente. Actualmente se está definiendo con los asesores el alcance de dichas modificaciones y/o ampliaciones.

Por otro lado, el diagnóstico social realizado por el asesor RESPONDE y validado por la Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales de ProInversión remarcan la necesidad de implementar un minucioso trabajo de sensibilización social para asegurar un proceso de promoción satisfactorio.



4. Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (IEC)

El cambio se debe a la espera de la decisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto al tratamiento de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República a la obra a fin de modificar el contrato de concesión

PROYECTOS QUE ACTUALIZAN EL MONTO DE INVERSIÓN



1. Masificación de Uso del Gas Natural - Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (IEA)

El Monto de Inversión del Proyecto para la cuarta versión del contrato era de US\$ 400 millones sin IGV aproximadamente, que consideraba una alta demanda por parte del sector industrial. El proyecto está enfocado en cubrir las necesidades de los hogares, por lo que se optimizó el Monto de Inversión del proyecto a US\$ 200 millones sin IGV aproximadamente, el cual está basado únicamente en el cumplimiento del Plan Mínimo de Conectados (8 años).



2. Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao (IEC)

El proyecto se encuentra en la fase de elaboración de estudios de pre inversión con un valor de inversión estimado de US\$ 260 millones, incluyendo el IGV.



3. Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva-Frontera (IEA)

El objetivo del proyecto es permitir el intercambio de excedentes de oferta de energía entre Perú y Ecuador. En consecuencia, se debe asegurar que los proyectos del lado peruano y del lado ecuatoriano tengan una fecha similar de finalización de ejecución de obras de modo que se pueda brindar certeza al mercado respecto a la fecha en la cual se iniciarían sus obligaciones.

Para este fin, los ministerios de energía de ambos países vienen coordinando los cronogramas de los proyectos y el cumplimiento de los siguientes hitos para la implementación de ambas infraestructuras que serán desarrolladas bajo mecanismos distintos. En el Perú, bajo el mecanismo de APP y en Ecuador bajo el mecanismo de contratación de Obra Pública.



4. Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas; Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas; Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas (IEA)

El proyecto se encuentra en la fase final, se cuenta con 7 postores interesados que han presentado documentación para iniciar el proceso de calificación, con miras a una adjudicación a finales de setiembre. El monto de inversión estimado es USD170 millones, incluyendo IGV.

• • •

B. PRINCIPALES AVANCES

RESULTADOS DEL SEMESTRE



1. Adjudicación de la PTAR Titicaca

El Consorcio Fypasa Construcciones S.A. de C.V. y Operadora de Ecosistemas S.A. de C.V. de capitales mexicanos, ganó la concesión del proyecto “Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca – PTAR Titicaca”, que beneficiará a más de 1.2 millones de peruanos de 10 localidades del departamento de Puno ubicadas alrededor del lago Titicaca. Este proyecto es la primera APP descentralizada del sector saneamiento promovida por ProInversión, y la primera APP bajo la modalidad de Iniciativa Privada Cofinanciada que se adjudica en el Perú.

El proyecto PTAR Titicaca es un sistema para tratar las aguas del desagüe antes que lleguen al Lago y lo contaminen. El consorcio ganador se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las PTAR de las localidades de Puno, Juliaca Ilave, Ayaviri, Juli y Moho, así como la operación y mantenimiento de las PTAR de las localidades de Azángaro, Yunguyo, Huancané y Lampa en el departamento de Puno.

El Consorcio Fypasa Construcciones S.A. de C.V. y Operadora de Ecosistemas S.A. de C.V. ganó la concesión del proyecto al ofrecer la menor Retribución por Inversión (RPI) de S/ 93 714 214; y la menor Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO) de S/ 39 821 156. Esta propuesta genera ahorros en aproximadamente 30% a favor del Estado.

Fueron cinco los postores de reconocida experiencia internacional quienes presentaron propuestas:

- Consorcio Fypasa Construcciones S.A. de C.V. y Operadora de Ecosistemas S.A. de C.V. (México)
- Consorcio Aguas de Puno (España)
- Consorcio Collas (Francia)
- FCC Aqualia (España)
- Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA, Sucursal del Perú (España)

Este proyecto cuenta con el apoyo y el consenso entre el gobierno nacional, autoridades regionales y locales, así como la población y la sociedad civil; lo cual es resultado del trabajo social realizado por ProInversión para difundir los alcances y beneficios del proyecto tomando en consideración la multiculturalidad de los grupos beneficiarios.

Cabe recordar que en el 2018 el proyecto fue reconocido como el Mejor Proyecto de Infraestructura Sostenible del Año, en el marco del 16° Premio Anual del Proyecto del Año Latinoamericano y del Caribe.



2. Promoción de la Ventana de IPC del sector Transportes y Comunicaciones



El 30 de diciembre del 2018, mediante Decreto Supremo N° 020-2018-MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso el plazo para la presentación de Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) en proyectos en infraestructura de transportes.

En virtud de este dispositivo, entre el 01 de abril al 15 de mayo de 2019 se presentaron dos Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPCs) denominadas: “Ferrocarril Lima – Ica” y “Tercer Grupo de Aeropuertos”.

Como consecuencia de la evaluación efectuada del cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite de ambas IPC, de acuerdo con lo indicado en el numeral 98.1 del artículo 98 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 (Reglamento), se admitió a trámite la IPC “Tercer Grupo de Aeropuertos”.

Para esta IPC, el Estado cofinanciará durante 15 años una remuneración por inversión (RPI). El proyecto contemplan diversas intervenciones en el mediano y largo plazo así como intervenciones inmediatas en los aeropuertos ubicados en las siguientes ocho localidades: Jauja, Huánuco, Jaén, Ilo, Nuevo Chimbote, Rioja, Tingo María y Yurimaguas.

Con la admisión a trámite se inicia el proceso de evaluación hasta su declaratoria de interés y posterior adjudicación; ya sea al proponente; o, en caso de concurso, a un tercero interesado.

PRINCIPALES ACCIONES EN CURSO



1. Anillo Vial Periférico

La Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) fue presentada ante PROINVERSIÓN el 14 de marzo de 2013. En abril de 2016 se dio inicio a la fase de formulación. El 16 de diciembre de 2016, se declaró viable el estudio de pre-inversión asociado a la IPC.

El 19 de setiembre de 2017 se aprobaron los criterios de elegibilidad de la IPC, con lo cual concluyó la etapa de formulación y se inició la fase de estructuración del Proyecto. Durante el periodo del 2017-2018 no hubo mayor avance en las actividades de la fase de

estructuración, toda vez que se estuvo a la espera de la definición del sector respecto de los siguientes temas: i) cronograma de ejecución de obras , que incluye el cronograma de liberación de predial y de interferencias planteado por el proponente, ii) determinación de las acciones a adoptar para el levantamiento de interferencias, iii) propuesta de metas de liberación de predios y áreas que requiere el proyecto para ser adjudicado. En setiembre de 2018, el MTC respondió el pedido de información requerido.

A finales de marzo 2019 se aprobaron las contrataciones de los Asesores externos (Legal, Técnico y Financiero) para brindar soporte requerido a PROINVERSIÓN durante las fases de estructuración y transacción.

Actualmente PROINVERSIÓN se encuentra elaborando el Informe de Evaluación Integrado y la versión inicial de contrato de concesión, con miras de obtener la declaratoria de Interés en el 4to trimestre de 2019.



2. Promoción de la Ventana de IPC del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Mediante Decreto Supremo N° 016-2019-VIVIENDA se dispuso el plazo para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas sobre proyectos de inversión destinados a servicios de saneamiento en la Región Loreto y en el área urbana de las provincias de Huaura, Barranca, Huancavelica, Andahuaylas e Ilo.

En el portal de PROINVERSION están publicadas las necesidades de intervención, la capacidad presupuestal máxima del ministerio, así como los parámetros objetivos en caso de ocurrir la presentación de varias propuestas de IPC para una misma necesidad de intervención.

De esta forma, entre el 05 de agosto y el 17 de setiembre de 2019 se espera que se presenten IPC para cada uno de los siguientes proyectos establecidos en el citado Decreto Supremo:

- Servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Iquitos (Mejoramiento y ampliación)
- Servicio de Tratamiento de aguas residuales en el área urbana de la provincia de Huaura
- Servicio de Tratamiento de aguas residuales en el área urbana de la provincia de Barranca
- Servicio de Tratamiento de aguas residuales en el área urbana de las provincias de Huancavelica y Andahuaylas
- Servicio de agua potable mediante Desalación de agua de mar en el área urbana de la provincia de Ilo
- Servicios de saneamiento rural en la región Loreto

GESTION COMERCIAL

Nuestra estrategia comercial apunta a atraer más postores de nuevos mercados a los proyectos en cartera. Identificamos potenciales inversionistas, los segmentamos y contactamos para brindarles información referida a nuestros proyectos de acuerdo a su interés, manteniéndolos permanentemente al tanto de los avances.

Durante el primer semestre del 2019, en el marco de las acciones de promoción internacional desarrolladas en las ciudades de Londres, París y Madrid tuvimos 39 reuniones con representantes de primer nivel de firmas de asesoría, empresas constructoras y/o operadoras, así como fondos de inversión.

Para el segundo semestre, se están programando acciones de promoción en Asia, Norteamérica, Europa y Sudamérica.

PRINCIPALES REUNIONES BILATERALES

Enero – Junio 2019

N°	EMPRESA	TIPO DE EMPRESA	SECTOR DE INTERES
1	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	Fondo de inversión	Transportes Agua y Saneamiento
2	ACCIONA	Inversionista	Transportes, Agua y Saneamiento, Salud
3	AIRTIFICIAL	Asesor	Transportes, Minería
4	ALEÁTICA	Inversionista	Toda la cartera
5	ALTRA CAPITAL	Fondo de inversión	Toda la cartera
6	BENOY	Inversionista	Transportes
7	BIWATER INTERNATIONAL	Inversionista	Agua y Saneamiento
8	BOMBARDIER	Inversionista	Ferrovionario
9	BTG PACTUAL	Fondo de inversión	
10	CINTRA	Inversionista	Transporte
11	COMSA INDUSTRIAL	Inversionista	Transportes
12	COPASA	Inversionista	Transportes, Salud, Agua y Saneamiento
13	CPS	Asesor	Transportes, Agua y Saneamiento

14	CROSSRAIL INTERNATIONAL	Inversionista	
15	CURRIE & BROWN	Asesor	Toda la cartera, Salud
16	EIFFAGE	Inversionista	Ferroviario
17	EPTISA	Asesor	Transportes, Agua y Saneamiento
18	FCC AQUALIA	Inversionista	Agua y Saneamiento
19	FERROVIAL	Inversionista	Transporte
20	GAZ ENERGIE	Inversionista	Hidrocarburos
21	GRUPO ORTIZ	Inversionista	Salud, Energía y Minas
22	INECO	Asesor	Transportes
23	IRIDIUM CONCESIONES	Inversionista	Toda la cartera
24	JOHN LAING GROUP	Fondo de inversión	Energía
25	LAGAN CONSTRUCTION	Inversionista	Transportes
26	MACQUARIE CAPITAL	Fondo de inversión	Toda la cartera
27	MOTT MACDONALD	Asesor	Toda la cartera
28	PROPARCO	Antena	
29	SACYR	Inversionista	Transportes, Agua y Saneamiento
30	SEOPAN	Asesor	Toda la cartera
31	SOCIETE GENERALE	Asesor	Toda la cartera
32	STADLERRAIL	Inversionista	Transportes
33	SYSTRA	Asesor	
34	TALGO	Inversionista	Transportes
35	TECNIBERIA	Asesor	Toda la cartera
36	THALES	Inversionista	Ferroviario
37	TYPSA	Asesor	Toda la cartera
38	WSP	Asesor	Energía y transporte
39	ZAHA HADID ARCH	Asesor	Transportes

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

En el marco de nuestra función de fortalecimiento de capacidades y asesoría técnica a funcionarios públicos en la aplicación de las herramientas de promoción de la inversión privada, en el primer semestre de 2019, se han desarrollado diversas actividades descentralizadas en todo el país, incluyendo no sólo a autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales en su primer año de gestión, sino también a funcionarios de distintos Ministerios del Gobierno Nacional.

- 650 reuniones/talleres informativos: Para la difusión de la normativa y procedimientos de Asociaciones Público-Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, en los 24 departamentos del país.
- 104 talleres de capacitación: En la normativa y procedimientos de Asociaciones Público-Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, a funcionarios de 120 entidades públicas.
- 105 reuniones de asistencia técnica para la identificación de proyectos, formulación de IMIAPP, y asesoría técnica en los procedimientos de Asociaciones Público-Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos de 42 entidades públicas.

• • •

C. MEJORAS INSTITUCIONALES



1. Guía Contractual y Contrato Estándar de proyectos APP (adjudicado)

En el mes de enero, ProInversión adjudicó, a la firma legal Hogan Lovells US LLP, la Buena Pro del servicio de Consultoría para la elaboración de una Guía Contractual y Contrato Estándar para proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP).

La estandarización de una Guía Contractual y un Contrato Estándar es una práctica recomendada por el Banco Mundial pues reduce la probabilidad de proponer adendas al contrato; reduce el tiempo involucrado en preparar y finalizar los contratos de APP; y reduce los costos de llegar a acuerdos y preparar contratos de APP. En Suma: menor tiempo en desarrollo de los proyectos y mejor calidad de los contratos.

La adjudicación se dio a través de un concurso público internacional que concitó el interés de cinco firmas legales internacionales de primer nivel. Además de Hogan Lovells presentaron propuestas Allen & Overy LLP, Clifford Chance US LLP, Squire Patton Boggs (US) LLP y White & Case LLP.

La aprobación de la versión final de la Guía contractual y contrato estándar se estima para diciembre de 2019. Actualmente, el consultor internacional ha presentado las versiones iniciales de la Guía Contractual y Contrato Estándar los cuales se encuentran en revisión de los equipos internos de Proinversión. Se prevé culminar el proceso de revisión interna para luego recibir la retroalimentación de distintas entidades públicas y del mercado.



2. Guía sobre la estructuración financiera de APP (en proceso)

Continuando con el proceso de mejora continua institucional, PROINVERSIÓN reconoce la necesidad de modernizar y estandarizar los documentos y lineamientos que son herramientas del proceso de promoción de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas; en este sentido, el desarrollo de una guía para la estructuración financiera constituye una prioridad, debido a que una metodología de evaluación y estructuración estandarizada proporciona transparencia, reduce el tiempo y los costos de transacción, y a su vez brinda un marco de predictibilidad al mercado.

El objetivo de esta consultoría es contar con los servicios de una firma con experiencia en procesos de estructuración y licitación; así como en estructuración financiera en proyectos de inversión a través de Asociaciones Público Privadas, y/o proyectos de infraestructura.

La Guía, como producto final, servirá de parámetro para la evaluación financiera de los proyectos en sus etapas de estructuración y licitación toda vez que, contendrá los lineamientos referidos al desarrollo de los modelos económicos financieros, principalmente lineamientos como los criterios para la determinación de la capacidad de financiamiento, la definición de estructuras financieras con sus respectivos mecanismos, de pago y/o garantías proporcionadas por el Concedente en los

casos en que éstas sean requeridas, así como la determinación de parámetros internacionales aceptados que permitan el cálculo entre otros de los flujos del proyecto.

Esta consultoría, se convocó bajo la modalidad de concurso público y contó con la participación de postores de talla internacional interesados en brindar el servicio, siendo adjudicada al Consorcio KPMG Perú-Brasil. La fecha programada para firma del contrato es el 02 de agosto.



3. SOURCE: Plataforma Digital para el Monitoreo de Avances y Calidad de Proyectos APP

Con el fin de continuar con el fortalecimiento de la gestión de los proyectos APP, ProInversión está enfocado en diseñar e implementar una nueva plataforma digital para el monitoreo de avances y calidad de los proyectos. Con este fin, se ha solicitado la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se está por firmar un convenio con la Fundación para Infraestructura Sostenible (SIF por sus siglas en inglés) para el diseño e implementación de la plataforma digital SOURCE en Perú. Este convenio, permitirá adaptar la plataforma SOURCE al marco regulatorio Peruano de APP.

La plataforma SOURCE fue desarrollada y financiada por las bancas multilaterales de desarrollo (BID, Banco Mundial, Asian Development Bank, entre otros), se encuentra en funcionamiento en más de 20 países en desarrollo, cuenta con más de 250 proyectos por un monto de inversión de USD 59,000 millones (CAPEX) de los cuales más del 60% son APPs. SIF mantiene una alianza con más de 30 organizaciones del sector privado entre las que se encuentran los principales bancos, fondos de inversión y empresas de ingeniería a nivel global. Asimismo, mantiene una colaboración con el Centro Global de Infraestructura (GIH) y un programa de capacitación en infraestructura sostenible para el sector público.

La implementación de SOURCE para el monitoreo de los proyectos APP en Perú traerá los siguientes beneficios:

- **Plataforma Única para el Monitoreo de APP:** La plataforma digital permitirá hacer seguimiento y monitoreo a un proyecto entre las múltiples entidades del Estado desde su formulación hasta su ejecución.
- **Estandarización de los procesos:** La plataforma SOURCE permitirá estandarizar los procesos en las distintas etapas de un proyecto de APP mejorando la predictibilidad e incorporación de mejores prácticas de forma escalable.
- **Tablero de control e información actualizada por proyecto:** Se podrá medir en tiempo real el avance y estado de cada proyecto. Asimismo, el sistema incorpora un mecanismo de validación para determinar el nivel de madurez y riesgo de cada proyecto.
- **Acceso a mejores prácticas y mejoras continuas:** Adicional a la adaptación de la plataforma al marco regulatorio Peruano se podrán incorporar actualizaciones de funcionalidad como resultado de los desarrollos que se lleven a cabo en los siguientes años. Un ejemplo, es la incorporación de herramientas de análisis de información.

La implementación de SOURCE en ProInversión, en su primera fase, se culminará a fines del 2019. Se espera concretar la incorporación de otras entidades participantes del proceso de APP en el primer semestre del 2020.





ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

WWW.PROINVERSION.GOB.PE
